



Informe intermedio

Proyectos 2015-2016

12 de julio de 2016

Avances en la instrumentación de los proyectos

Como parte del programa de trabajo conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) al amparo del Plan Operativo 2015-2016, el 1 de julio de 2015 se lanzaron 16 proyectos nuevos, que forman parte del primer conjunto de proyectos e iniciativas establecidos en el marco del Plan Estratégico 2015-2020 de la CCA.

La instrumentación de estos proyectos dio inicio a mediados de agosto de 2015, con la designación de los integrantes de los tres países para conformar los comités directivos específicos de cada proyecto, así como con las conferencias de arranque para concebir los correspondientes planes de trabajo. En ese momento (mediados de agosto) 50 por ciento de los proyectos realizó sus conferencias telefónicas iniciales, proporción que había aumentado a 87 por ciento para principios de septiembre de 2015. Dos proyectos (6 y 7) no arrancaron sino hasta finales de octubre de 2015, debido a demoras en la plena integración de sus respectivos comités directivos trinacionales.

El programa de trabajo conjunto comprende, además, las siguientes iniciativas trinacionales respaldadas por la CCA: el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) de América del Norte, el *Atlas ambiental de América del Norte*, el Sistema de Monitoreo del Cambio en la Cobertura del Suelo de América del Norte (NALCMS, por sus siglas en inglés) y la Plataforma interactiva, en línea, de información sobre el cambio climático. Estas iniciativas siguen un ciclo de presupuesto anual, independiente de los proyectos.

Proyectos 2015-2016



Dieciséis proyectos conforman el Plan Operativo 2015-2016 de la CCA.

Doce de 16 son proyectos nuevos, de los cuales algunos se basan en trabajo previo de la CCA.

Los restantes cuatro continúan proyectos financiados en el marco del Plan Operativo 2013-2014.


Comités directivos

En agosto de 2015 se formaron dieciséis comités directivos para respaldar los proyectos del Plan Operativo 2015-2016 de la CCA. A principios de septiembre de 2015 se había confirmado la plena integración de los comités directivos correspondientes a 14 de los 16 proyectos. La conformación completa de los otros dos proyectos se logró hasta finales de octubre de 2015. Si bien, los integrantes de los comités directivos representan básicamente al ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (*Environment and Climate Change Canada*), la Agencia de Protección Ambiental (*Environmental Protection Agency*, EPA) de Estados Unidos y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, lo cierto es que 14 de los 16 comités directivos son un buen ejemplo de la colaboración interinstitucional trilateral, al incluir también a expertos de dependencias gubernamentales pertenecientes a los sectores de energía, silvicultura, salud, transporte, vida silvestre, parques nacionales, pesca y océanos, y asuntos indígenas. Entre el 1 de septiembre

de 2015 y el 30 de junio de 2016 los comités directivos de la mayoría de los proyectos sostuvieron mensualmente conferencias telefónicas trinacionales.

Contratos

Del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016 se firmaron 38 contratos para los 16 proyectos, al igual que cuatro contratos para otras iniciativas (RETC, atlas ambiental y cobertura del suelo) al amparo de los programas de la CCA. Como se muestra en la siguiente gráfica, la mayoría de los contratos se celebraron con organizaciones no gubernamentales (ONG) (nueve), seguidas por agrupaciones indígenas, particulares y empresas del sector privado (siete cada uno). La evaluación realizada por la propia CCA respecto de los contratos finalizados a la fecha muestra índices de satisfacción de 95 por ciento en lo concerniente a la calidad del trabajo de los contratistas y 91 por ciento en cuanto a puntualidad.

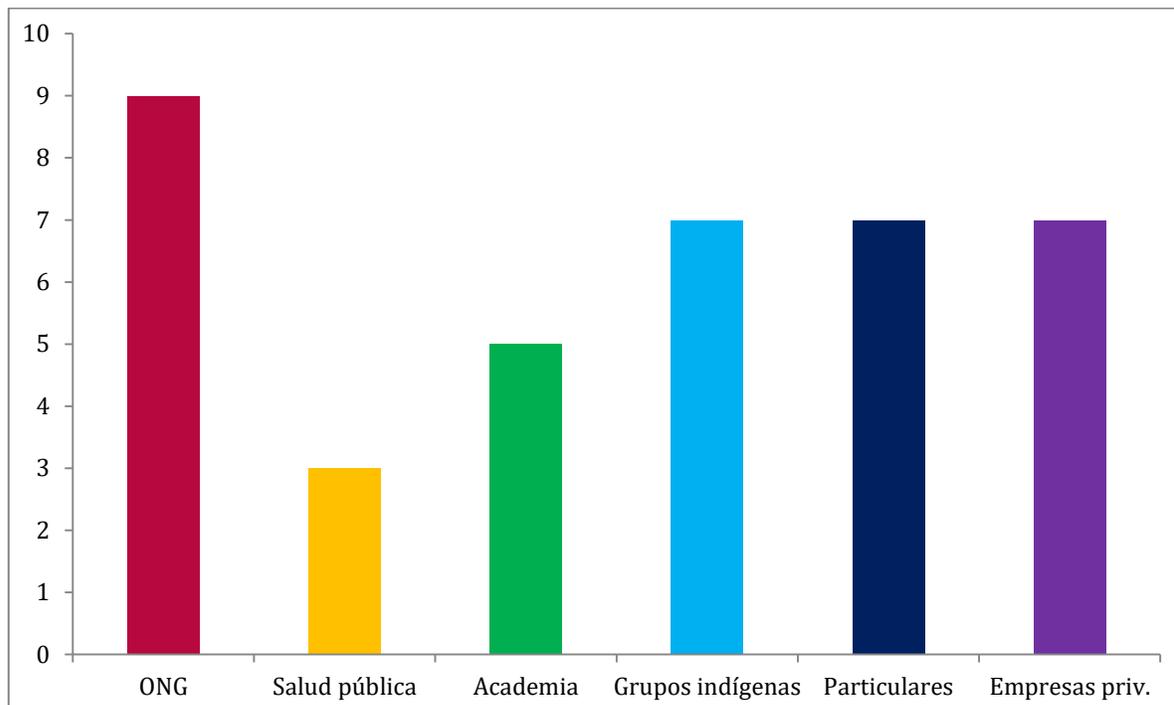


Número de contratos por sector: del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016

Reuniones

Entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 se llevaron a cabo doce reuniones relacionadas con proyectos y dos con iniciativas respaldadas por la CCA. La distribución por tema se muestra en la gráfica a continuación. La gran cantidad de reuniones sostenidas por los proyectos relacionados con el área estratégica *comunidades y ecosistemas sustentables* refleja los mandatos dentro de cada proyecto de crear alianzas y realizar consultas amplias a

grupos interesados. A la fecha, datos emanados de encuestas realizadas sobre las reuniones efectuadas muestran un índice de satisfacción de 95.3 por ciento en lo tocante a contenido y facilitación de la reunión.

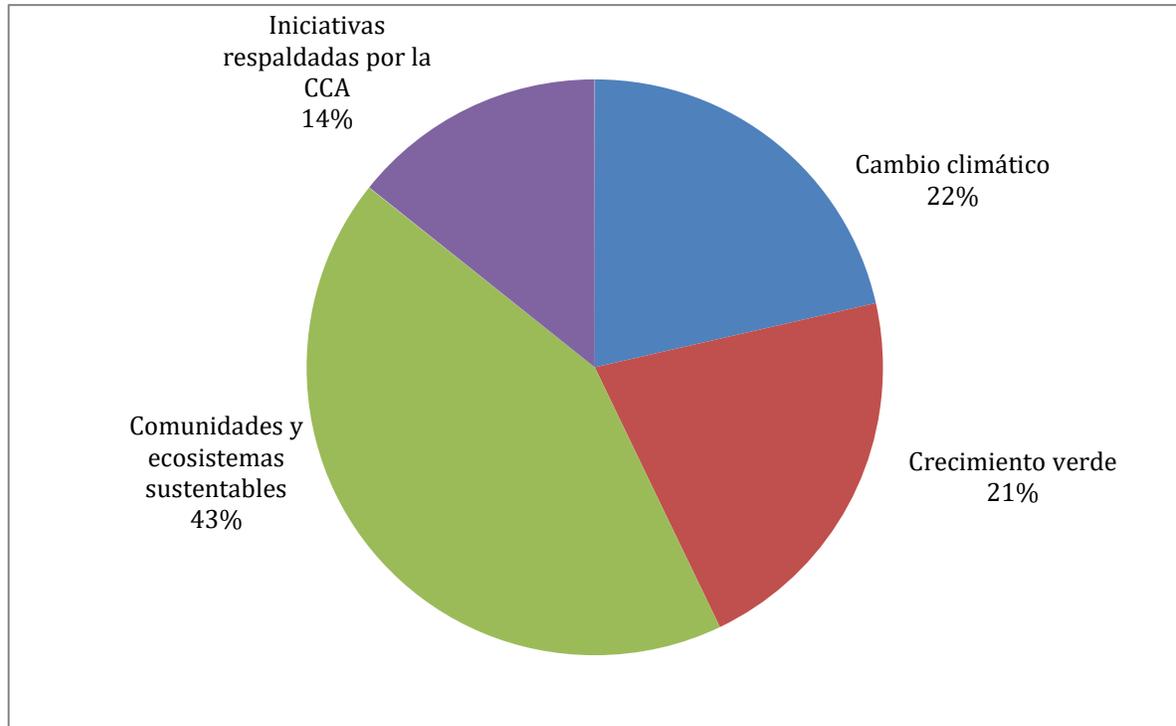

Porcentaje de reuniones: del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016


Resultados esperados

Los avances en los productos previstos de cada proyecto se resumen en el anexo 1 (disponible solamente en inglés). En total, 25 publicaciones de los 16 proyectos se someterán al proceso institucional de aseguramiento de la calidad. Se espera que, a más tardar en junio de 2017, quede concluido 72 por ciento de todas las publicaciones planeadas, incluidos los correspondientes trabajos de traducción.

Presupuesto

Los gastos incurridos entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 del presupuesto asignado a los proyectos se mantuvieron dentro de lo programado para la mayor parte de éstos. El nuevo reglamento financiero de la CCA permite que el presupuesto correspondiente al año 1 se gaste en el año 2 para actividades aún en curso, lo cual facilitará la aplicación de los recursos antes del 30 de junio de 2017. Aunque son numerosos los proyectos rezagados en cuanto al gasto de los fondos presupuestados (véase la gráfica *infra*), a principios de

agosto de 2016 se efectuarán desembolsos cuantiosos en relación con estos proyectos. En total, 83 por ciento del presupuesto asignado al primer año de los proyectos ya se ejerció.

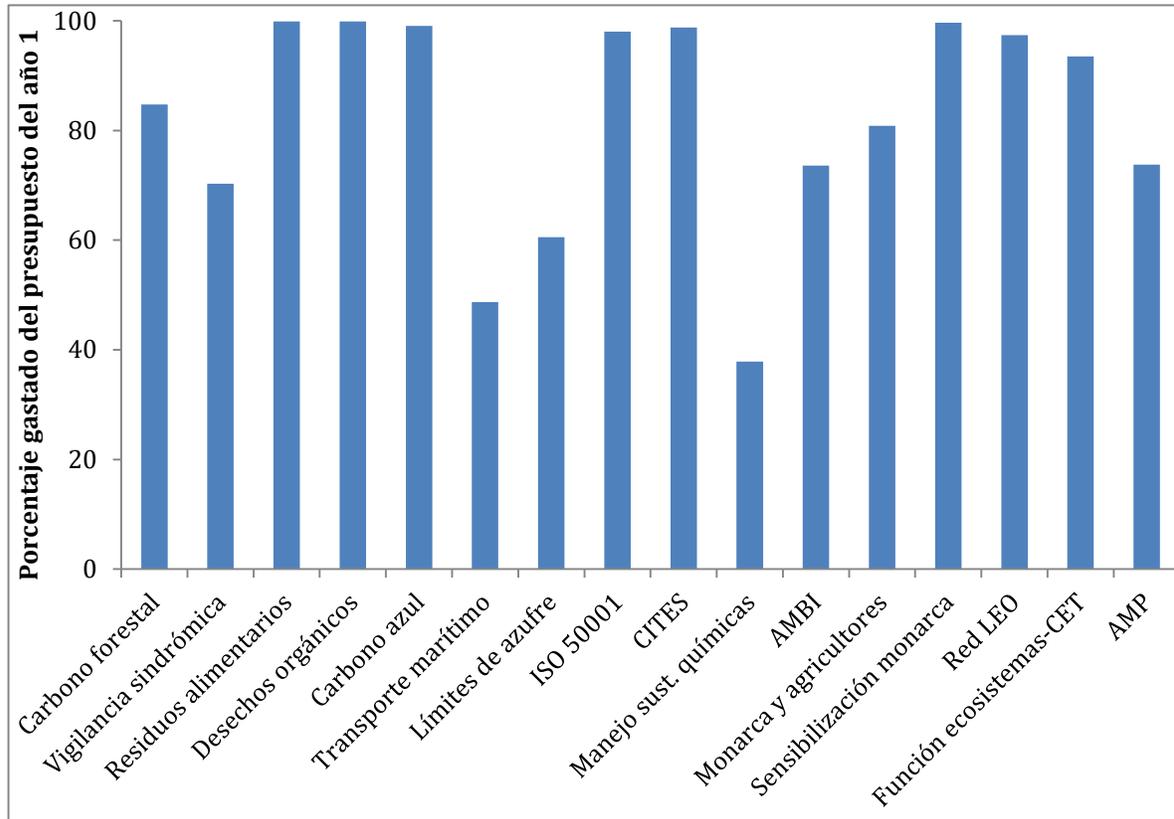

Gasto al 30 de junio de 2016 del presupuesto para proyectos correspondiente al año 1

Medición del desempeño

Los indicadores de desempeño, identificados en la descripción de cada proyecto, se evalúan en forma trimestral utilizando una metodología basada en criterios SMART (acrónimo en inglés de: específico, medible, asequible, relevante y calendarizable) para medir los avances en la consecución de las metas y objetivos de cada proyecto. Estas mediciones se reportarán al concluir el Plan Operativo 2015-2016 de la CCA.
